



제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

|        |                                    |       |              |           |                 |
|--------|------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------------|
| 위 치:   | 제주특별자치도 제주시 조천읍 고래리 산73 (신주소: 제주시. |       |              |           |                 |
| 사 업 명: | 먹는샘물 관측망 설치사업                      | 사업년도: | 2019         | 허가번호:     | W201810029      |
| 지 구 명: | 삼다수3취수원 감시3호정                      | 착정시작: | 2019-07-31   | 착정기사:     | 고명신             |
| 발주기관:  | 제주특별자치도개발공사                        | 착정종료: | 2020-01-22   | 조 사 자:    | 박준범, 김태형        |
| 시행기관:  | 한국농어촌공사 제주지역본부                     | 착정공법: | ROTARY청수순환공법 | 양 수 량:    | 900.00 m m3/day |
| 관정용도:  | 조사관측용                              | 착정심도: | 430.0 m      | 자연수위:     | 286.9 m         |
| 좌 표:   | X: 168551.55 Y: 41687.29           | 착정구경: | 350 mm       | 안정수위:     |                 |
| 표 고:   | 470.0 m                            | 관정구경: | 200 mm       | 원도이미지파일명: |                 |
| 좌 표 계: | (구) 동경좌표계 TM                       | 비 고:  |              |           |                 |

| 표고 / 심도<br>(m) | 주 상 도 | 대 수 층 | 암 석 명<br>지질학명<br>(기호)                              | 암 상 설 명          | 관정주상도 | 관정설치<br>정 보 |
|----------------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|
| 0              |       |       | 표토<br>Topsoil                                      | 그라우팅.<br>(심도=0m) |       |             |
| 460            |       |       | 회색; 암력; 표면 산화.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=1.5m)          |                  |       |             |
|                |       |       | 상부 적색 산화; 클링커 접촉.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=8m)         |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 각진 절리발달; 치밀질.코어회수정도= 보통.<br>(심도=9m)            |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=10m)                 |                  |       |             |
|                |       |       | 회색현무암<br>AB                                        |                  |       |             |
|                |       |       | 청회색; 변색됨; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=15.5m)         |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=17.5m)               |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 슬라임; 클링커; 치밀질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=24.5m)     |                  |       |             |
| 440            |       |       | 회색; 파호이호이 용암류의 상부 피각부.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=27.8m) |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=32m)                 |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=34m)                 |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=35m)                 |                  |       |             |
| 40             |       |       | 반상장석현무암<br>PFB                                     |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=44.5m)               |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=45.5m)               |                  |       |             |
|                |       |       | 회색; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=48.5m)               |                  |       |             |

JPDC WELLLOG (2) NEW\_PROJECT\_2015.10.13.GPJ JPDC\_V1.3\_2015.GDT 20-8-13



제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유통을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 고래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

착정시작: 2019-07-31

착정기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 900.00 m<sup>3</sup>/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

착정구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

| 표고 / 심도<br>(m) | 주 상 도 | 대<br>수<br>층 | 암 석 명<br>지질학명<br>(기호) | 암 상 설 명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 관정주상도 | 관정설치<br>정 보 |
|----------------|-------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 420—           |       | AB          | 휘석현무암                 | 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=51m)<br>간헐적 절리 발달; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=52m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| —60            |       |             | 장석현무암                 | 암적색; 집괴암; 슬라임.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=54.5m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| 400—           |       | FB          | 장석현무암                 | 암회색; 슬라임.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=70m)<br><br>암회색; clastogenic lava를 이룬; 다공질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=74.5m)<br><br>암회색; 락스암을 지닌; 다공질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=76.7m)<br><br>흑회색; clastogenic lava 양상을 띠; 지밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=82.5m)<br><br>회색; 수직절리; 락스암을 지닌; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=86m)<br>회색; 락스암을 지닌; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=87m)<br><br>회색; 수직절리; 락스암을 지닌; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=90m)<br>회색; 락스암을 지닌; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=92m)<br><br>암적색; clastogenic lava; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=96m)<br>회색; 락스암을 지닌; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=97m)<br>암적색; clastogenic lava; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=98m) |       |             |
| —80            |       |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
| 380—           |       |             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |

JPDC WELLOG (2) NEW\_PROJECT\_2015.10.13.GPJ JPDC\_V1.3\_2015.GDT 20-8-13



제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

|        |                                    |       |              |           |                 |
|--------|------------------------------------|-------|--------------|-----------|-----------------|
| 위 치:   | 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시. |       |              |           |                 |
| 사 업 명: | 먹는샘물 관측망 설치사업                      | 사업년도: | 2019         | 허가번호:     | W201810029      |
| 지 구 명: | 삼다수3취수원 감시3호정                      | 작성시작: | 2019-07-31   | 작성기사:     | 고명신             |
| 발주기관:  | 제주특별자치도개발공사                        | 작성종료: | 2020-01-22   | 조 사 자:    | 박준범, 김태형        |
| 시행기관:  | 한국농어촌공사 제주지역본부                     | 작성공법: | ROTARY청수순환공법 | 양 수 량:    | 900.00 m m3/day |
| 관정용도:  | 조사관측용                              | 작성심도: | 430.0 m      | 자연수위:     | 286.9 m         |
| 좌 표:   | X: 168551.55 Y: 41687.29           | 작성구경: | 350 mm       | 안정수위:     |                 |
| 표 고:   | 470.0 m                            | 관정구경: | 200 mm       | 원도이미지파일명: |                 |
| 좌 표 계: | (구) 동경좌표계 TM                       | 비 고:  |              |           |                 |

| 표고 / 심도<br>(m) | 주 상 도 | 대<br>수<br>층    | 암 석 명<br>지질학명<br>(기호) | 암 상 설 명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 관정주상도 | 관정설치<br>정 보 |
|----------------|-------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 100            |       | 장석현무암<br>FB    |                       | 적회색; 하부접촉; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=99m)<br>슬라임.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=100m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
| 360            |       |                |                       | 암적색; 집괴암; 슬라임 및 일부 구간.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=103m)<br>암적색; 슬라임.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=105m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| 120            |       | 반상장석현무암<br>PFB |                       | 슬라임; 다공질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=118m)<br>회색; 깨짐발달; 클링커; 다공질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=120.5m)<br>회색; 절리발달; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=123m)<br>회색; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=125.2m)<br>슬라임; 클링커.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=128m)<br>회색; 지밀질.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=130m)<br>슬라임; 클링커.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=132m)<br>회색; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=134.5m)<br>회색; 지밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=135m)<br>슬라임; 클링커.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=137.5m)<br>회색; 수평기공대 발달; 지밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=141m)<br>회색; 부분 경사 절리 발달; 하부 접촉대; 지밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=145m) |       |             |
| 340            |       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| 140            |       |                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |

JPDC WELLOG (2) NEW\_PROJECT\_2015.10.13.GPJ JPDC\_V1.3\_2015.GDT 20-8-13





제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시).

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

작성시작: 2019-07-31

작성기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종료: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

작성공법: ROTARY정수순환공법

양 수 량: 900.00 m<sup>3</sup>/day

관정용도: 조사관측용

작성심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

작성구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

| 표고 / 심도<br>(m) | 주 상 도 | 대<br>수<br>층   | 암 석 명<br>지질학명<br>(기호) | 암 상 설 명                                                                                                   | 관정주상도 | 관정설치<br>정 보 |
|----------------|-------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 320            |       | 비반상현무암<br>ApB | 고토암<br>PS             | 적색; 슬라임; 풍화잔류토.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=150.2m)<br>회색; 풍화대; 산화면; 암력으로 깨져 회수; 치밀질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=151m) |       |             |
| 160            |       |               |                       | 회색; 다공질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=157m)                                                                       |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 슬라임; 깨짐 발달; 산화면; 치밀질.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=160m)                                                      |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=167m)                                                                       |       |             |
| 300            |       | 비반상현무암<br>ApB | 고토암<br>PS             | 적색; 슬라임; 풍화잔류토.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=170.3m)<br>회색; 슬라임; 풍화대; 치밀질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=171m)             |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 슬라임; 50 cm 암괴; 치밀질.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=174m)                                                        |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 미약한 미반정의 감람석; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=175.5m)                                                       |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 층의 상부; 클링커와 용암 흔재; 다공질.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=178m)                                                    |       |             |
| 180            |       |               |                       | 회색; 산발적 기공; 수직절리발달; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=181m)                                                       |       |             |
|                |       |               |                       | 슬라임; 클링커.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=184.2m)                                                                    |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 다공질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=186.5m)                                                                     |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=187.5m)                                                                     |       |             |
| 280            |       | 장석현무암<br>FB   | 고토암<br>PS             | 슬라임; 하부 접촉면.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=189.5m)<br>슬라임; 풍화잔류토.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=189.8m)                     |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 슬라임; 클링커와 상부 용암.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=190m)                                                           |       |             |
|                |       |               |                       | 회색; 산발적 기공; 수직절리발달; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=192m)                                                       |       |             |
|                |       |               | 고토암                   | 회색; 슬라임; 하부 접촉면.코어회수정도= 매우 불량.                                                                            |       |             |



제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

착정시작: 2019-07-31

착정기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

착정종료: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

착정공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 900.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

착정심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

착정구경: 350 mm

안정수위:


표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

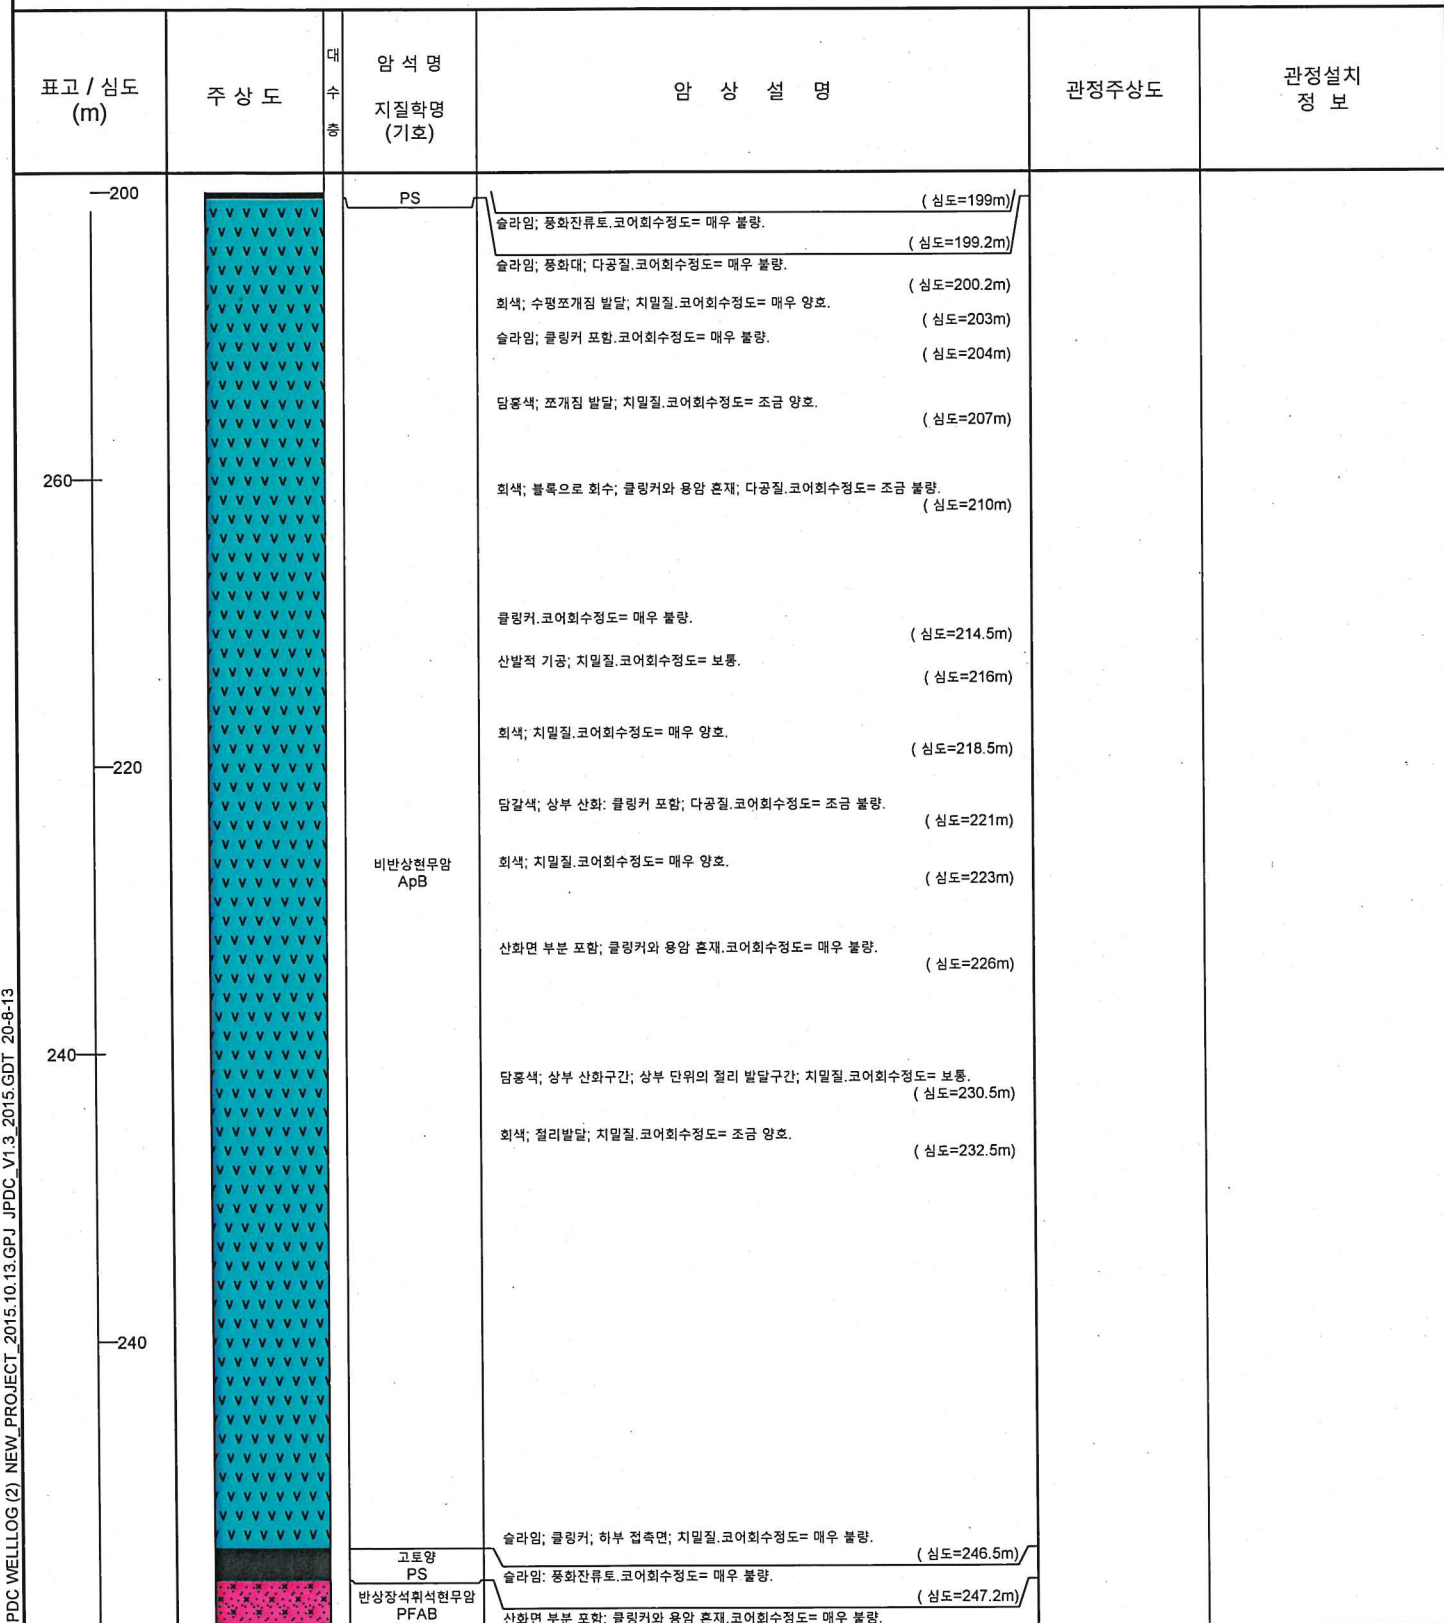

JPDC WELLOG (2) NEW\_PROJECT\_2015.10.13.GPJ JPDC\_V1.3\_2015.GDT 20-8-13



제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

작성시작: 2019-07-31

작성기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종료: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

작성공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 900.00 m m3/day

관정용도: 조사관측용

작성심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

작성구경: 350 mm

안정수위:


표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

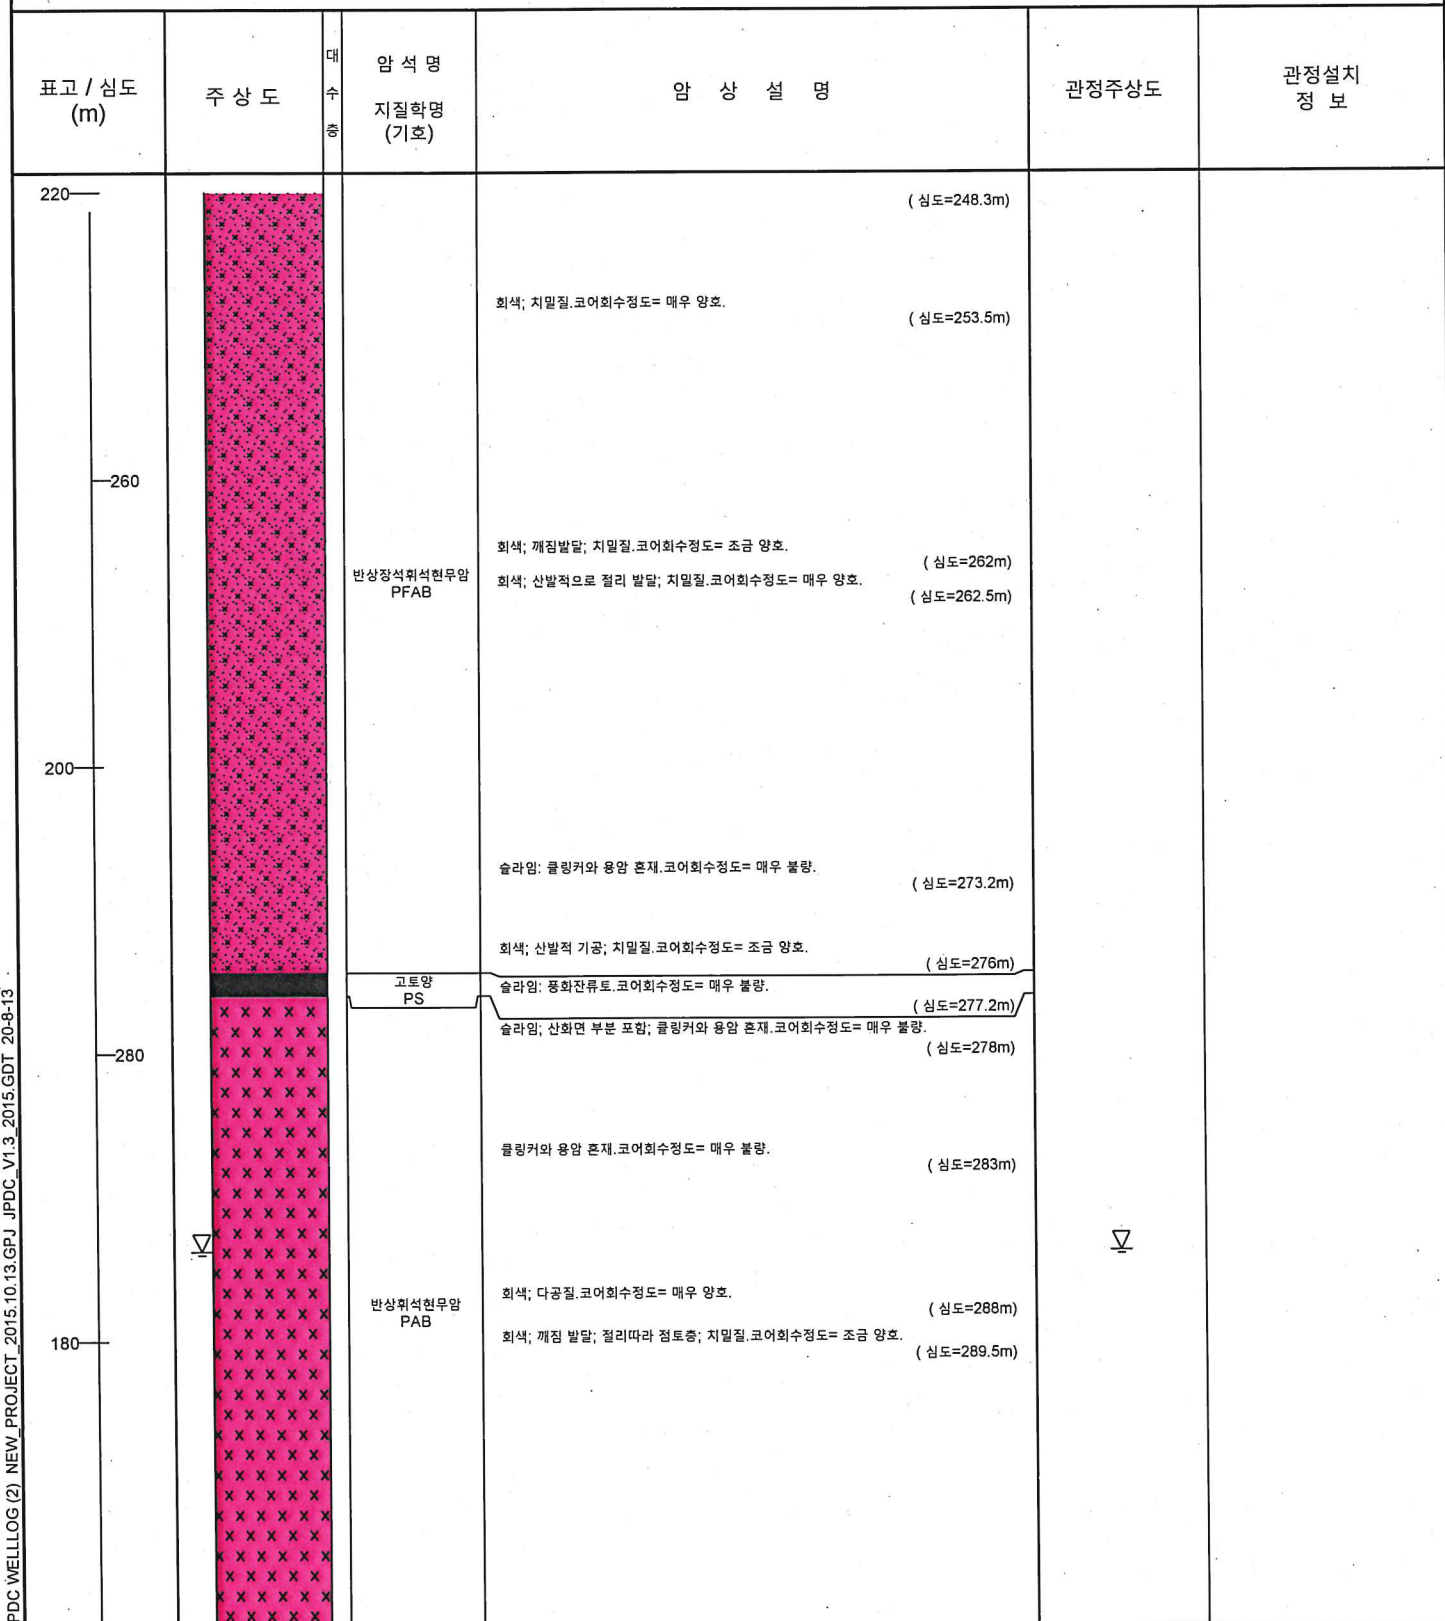





제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 고래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

작성시작: 2019-07-31

작성기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종류: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

작성공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 900.00 m<sup>3</sup>/day

관정용도: 조사관측용

작성심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

작성구경: 350 mm

안정수위:

표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm


원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

| 표고 / 심도<br>(m) | 주 상 도 | 대<br>수<br>층 | 암 석 명<br>지질학명<br>(기호) | 암 상 설 명                                                          | 관정주상도 | 관정설치<br>정 보 |
|----------------|-------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| —300           |       |             | 반상회색현무암<br>PAB        | 슬라임, 산화면 부분 포함; 클링커와 용암 존재; 하부 접촉면.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=303.5m) |       |             |
| 160            |       |             | 분석<br>SC              | 슬라임: tephra 층리발달.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=308.5m)                   |       |             |
|                |       |             |                       | 황적색; 슬라임; 풍화대.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=309m)                        |       |             |
|                |       |             | 반상회색현무암<br>PAB        | 회색; 절리발달; 치밀질.코어회수정도= 매우 양호.<br>(심도=313.5m)                      |       |             |
|                |       |             |                       | 회색; 상부 절리면에 토양 증진.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=315m)                    |       |             |
| —320           |       |             | 분석<br>SC              | 풍화대; 하부 접촉면.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=323m)                          |       |             |
|                |       |             | 고토양<br>PS             | 슬라임: tephra 층리발달.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=323.3m)                   |       |             |
|                |       |             | 감람석현무암<br>OB          | 슬라임.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=323.4m)                                |       |             |
|                |       |             |                       | 풍화대.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=323.5m)                                |       |             |
|                |       |             |                       | 슬라임; 클링커 산화면 접촉; 깨짐; 절리를 따라 점토층.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=325m)      |       |             |
| 140            |       |             | 고토양<br>PS             | 회색; 깨짐 발달; 1.5m 암괴; 다공질.코어회수정도= 조금 불량.<br>(심도=326m)              |       |             |
|                |       |             |                       | 클링커.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=328m)                                  |       |             |
|                |       |             |                       | 풍화대; 하부 접촉면.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=329.7m)                        |       |             |
|                |       |             |                       | 슬라임; 풍화잔류토.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=330m)                           |       |             |
|                |       |             |                       | 황적색; 슬라임; 풍화대.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=330.7m)                      |       |             |
|                |       |             |                       | 황적색; 슬라임; 다공질(335.5); 클링커와 용암 존재.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=334m)     |       |             |
|                |       |             |                       | 회색; 치밀질.코어회수정도= 보통.<br>(심도=337m)                                 |       |             |
|                |       |             | 비반상현무암<br>ApB         | 황갈색; 슬라임; 풍화대; 산화면; 깨짐 발달.코어회수정도= 매우 불량.<br>(심도=339.6m)          |       |             |
|                |       |             |                       | 암회색; 깨짐 발달; 치밀질.코어회수정도= 조금 양호.<br>(심도=344m)                      |       |             |
| —340           |       |             |                       |                                                                  |       |             |

|                                                                                                                                       |                                                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>제주특별자치도개발공사</b><br>JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO. | 본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유통을 금지합니다.<br><h1 style="margin: 0;">지 질 주 상 도</h1> | 공번: <b>M3-3</b>         |
| 위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 고래리 산73 (신주소: 제주시.                                                                                               |                                                                                  |                         |
| 사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업                                                                                                                  | 사업년도: 2019                                                                       | 허가번호: <b>W201810029</b> |
| 지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정                                                                                                                  | 착정시작: 2019-07-31                                                                 | 착정기사: 고명신               |
| 발주기관: 제주특별자치도개발공사                                                                                                                     | 착정종료: 2020-01-22                                                                 | 조 사 자: 박준범, 김태형         |
| 시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부                                                                                                                  | 착정공법: ROTARY청수순환공법                                                               | 양 수 량: 900.00 m m3/day  |
| 관정용도: 조사관측용                                                                                                                           | 착정심도: 430.0 m                                                                    | 자연수위: 286.9 m           |
| 좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29                                                                                                         | 착정구경: 350 mm                                                                     | 안정수위:                   |
| 표 고: 470.0 m                                                                                                                          | 관정구경: 200 mm                                                                     | 원도이미지파일명:               |
| 좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM                                                                                                                   | 비 고:                                                                             |                         |

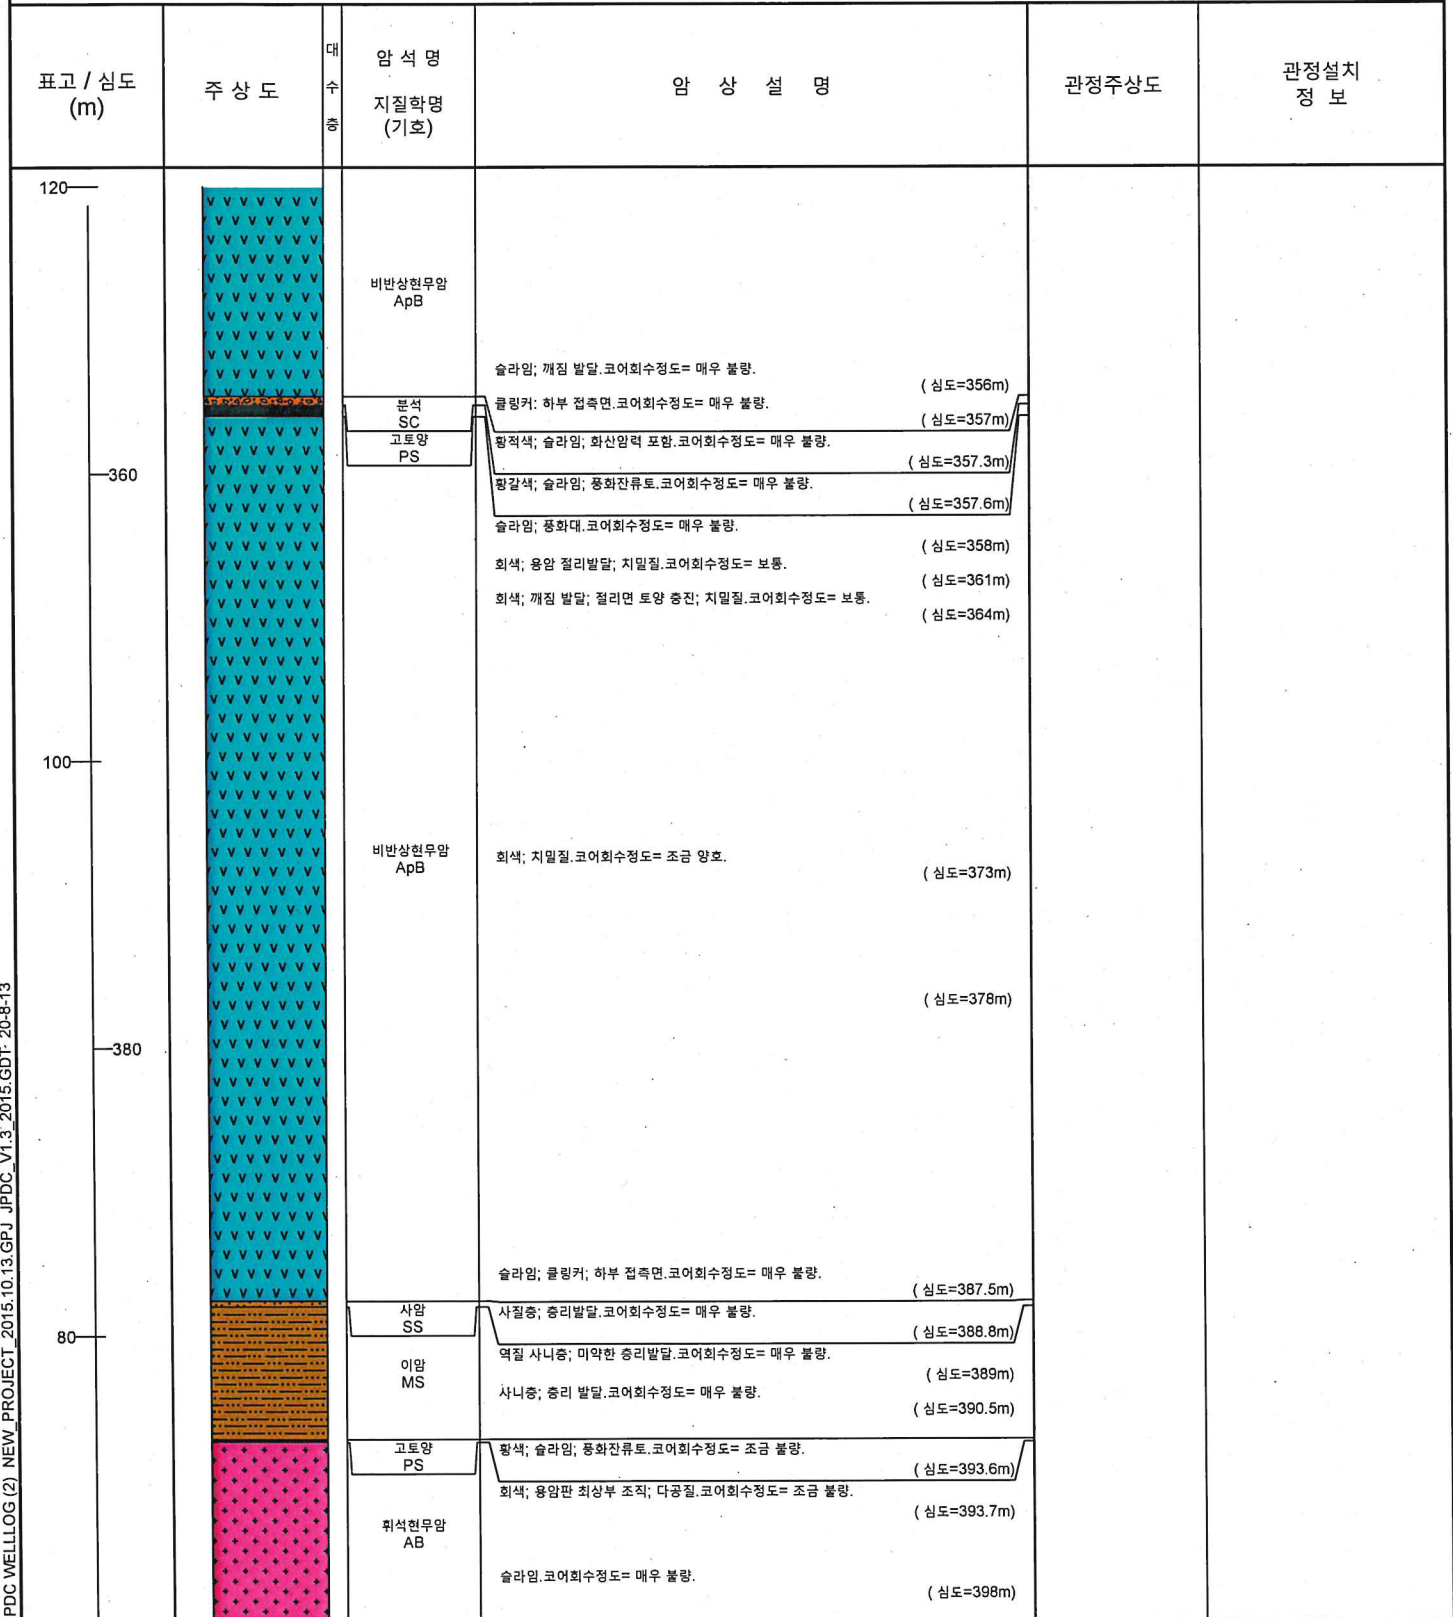





제주특별자치도개발공사  
JEJU PROVINCE DEVELOPMENT CO.

본 문서는 제주특별자치도개발공사의 중요 문서로 무단 유출을 금지합니다.

# 지 질 주 상 도

공번: M3-3

위 치: 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산73 (신주소: 제주시.

사 업 명: 먹는샘물 관측망 설치사업

사업년도: 2019

허가번호: W201810029

지 구 명: 삼다수3취수원 감시3호정

작성시작: 2019-07-31

작성기사: 고명신

발주기관: 제주특별자치도개발공사

작성종료: 2020-01-22

조 사 자: 박준범, 김태형

시행기관: 한국농어촌공사 제주지역본부

작성공법: ROTARY청수순환공법

양 수 량: 900.00 m<sup>3</sup>/day

관정용도: 조사관측용

작성심도: 430.0 m

자연수위: 286.9 m

좌 표: X: 168551.55 Y: 41687.29

작성구경: 350 mm

안정수위:


표 고: 470.0 m

관정구경: 200 mm

원도이미지파일명:

좌 표 계: (구) 동경좌표계 TM

비 고:

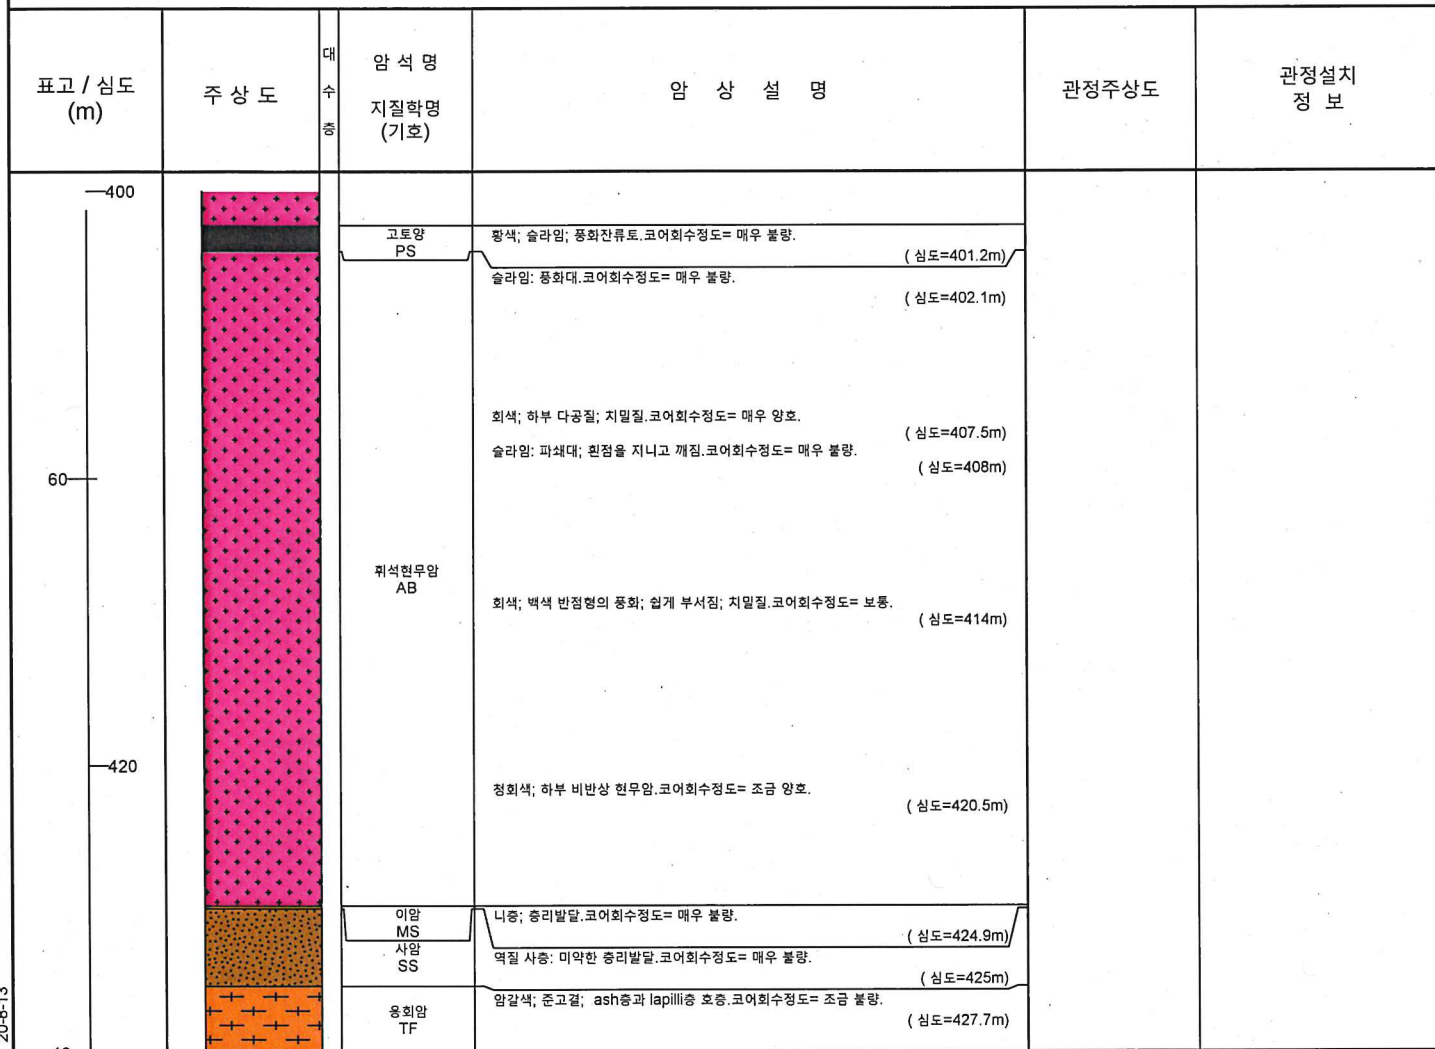

<JPDC 물산업연구센터>

프로젝트명: gINT을 이용한 주상도 구축사업

프로젝트 번호: 2014-12-18-20

다큐먼트 번호: gINT을 이용한 주상도 구축사업 (1차)
